

30.4.2009  
FT Kari Uotila  
Muuritutkimus ky  
suovillankatu 3 20780 Kaarina

Naantalin kirkon sakariston edustan kalkkivilaattaladelman uudistustyö huhtikuussa 2009

Naantalin kirkon sakariston oviaukon edustalla on ollut useiden vuosien ajan kalkkivilaatoista ladottu sisäänkäyntiladelmä jossa on ollut alkujaan kymmenkunta kalkkikiveä 3-4 rivissä. Kalkkikivistä osa on jäänyt asfaltoidun pihan pinnan alle ja alkanut rapautua voimakkaammin liuskeisiksi paloiksi. Paloja on ajan kuluessa kerätty talteen ja vuoden 2008 lopulla nousi esiin kohteen korjaustarve koska alueelle kertyi pintavesi ja talvikaudella alue jäättyi. Kalkkikivien päälle oli paikoin tuotu hiekoitushiekkaa joka kulutti ja hioi osaa laatoista.

Kohte kunnostettiin huhtikuussa 2009 ja kohteen suunnittelusta ja rakentamisesta Naantalin seurakunnan puolelta vastasi ins. Jouko Sjöberg. Rakennustyön suoritti rkm Jari Venhe ja kohteen arkeologisesta seurannasta vastasi FT Kari Uotila ja seurantaan osallistui myös FM Markus Kivistö.

Alueelta poistettiin kalkkivilaatat ja niiden palaset. Laatoissa oli tasaisia kulumapintoja mutta niiden saattoi olettaa syntyneen nykyisellä paikallaan. Mitään selviä viitteitä laattojen mahdollisesta muusta alkuperäisestä käyttötarkoituksesta ei saatu vaikka jokainen kivi tarkistettiin huolella. Kivien laatu oli heikentynyt voimakkaasti maassa ollessaan ja ne osoittautuivat hyvin liuskeisiksi ja varsinaista pintakiveä ei useimmissa tapauksissa ollut kuin 2-3 cm. Näitä kiviä ei enää uudelleen käytetty ladonnassa vaan se tehtiin vain parhaiten säilyneistä 6-7 kivistä joista yksi oli paikalla uusi.


Kalkkikivien alla oli selvä tasaushiekka ja sen alla sekoittunut hiekka ja hiekkamaakerros, joka ulottui 20-25 cm syvyyteen maan pinnasta. Pintaveden poisto tehtiin tähän korkeuteen joten missään vaiheessa ei tavoitettu kirkon vanhempia maakerroksia. Nykyisellä maanpinnalla ei esimerkiksi sakariston lattian paljon matalamman korkeuden perusteella ole yhteyttä vanhempaan maanpintaan vaan se on myöhemmän maankäytön tulos. Tämän perusteella myös nyt suoritettu kivien uudelleen ladonta ei kohdistunut vanhempiin kerroksiin lainkaan.

Kohteen rakennustyö tehtiin mahdollisuuksien mukaan aikaisempia materiaaleja ja pohjaratkaisuja mukaillen ja kohde valvottiin arkeologisesti. Siitä ei kertynyt kovin paljon uutta informaatiota Naantalin kirkon historiaan.

Kaarinassa 30.4.2009

FT Kari Uotila  
Muuritutkimus ky



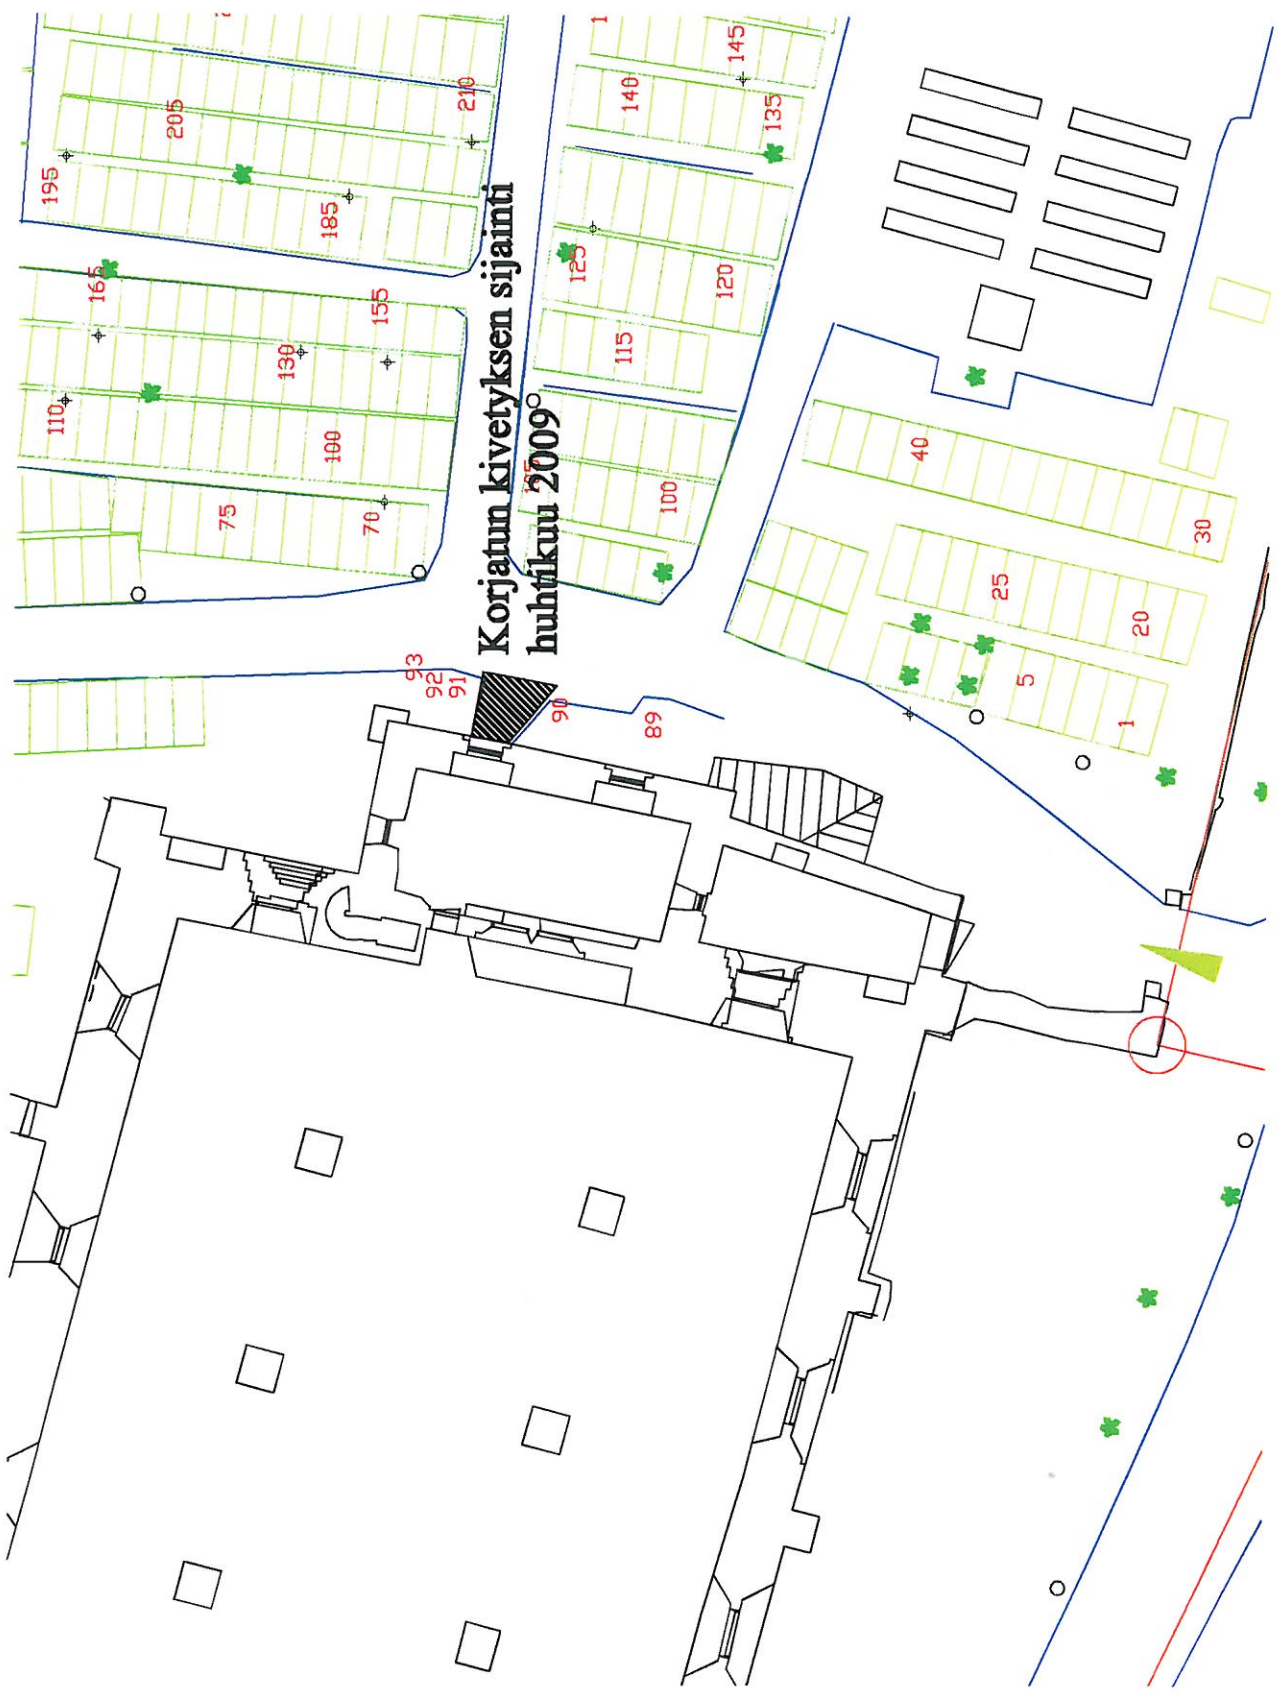

**Korjaus kivetyksen sijainti  
huhtikuu 2009**
